Plan de actividades

MY TALKING HANDS

Elaborado por:

Pool Chuc Martín Jesús

Diagrama de Gantt
Para ver a detalle en el siguiente enlace: https://app.clickup.com/90141060582/v/li/901414861794

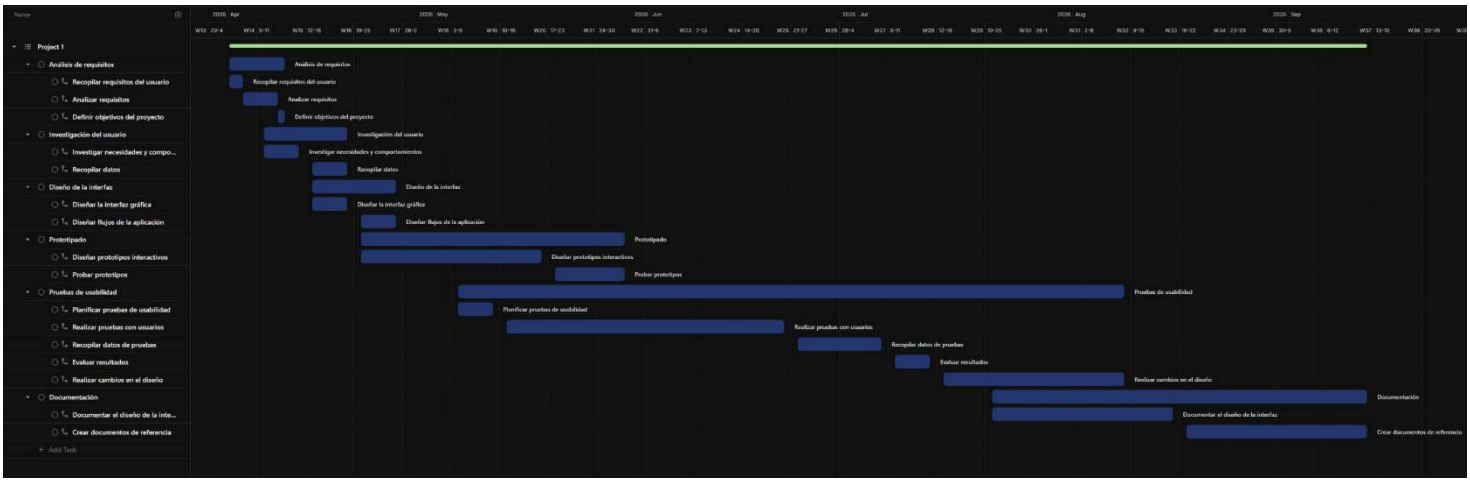

Tabla de actividades y presupuestos:

ID	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración (Días)	Costo	Responsables	Cant. Trabajadores
A	**Análisis de requisitos**	**01/04/26**	**08/04/26**	**6**	**$11,520**	-	-
A1	Recopilar requisitos del usuario	01/04/26	02/04/26	2	$3,840	Capi, Mauricio, Jareth	3
A2	Analizar requisitos	03/04/26	07/04/26	3	$5,760	Capi, Mauricio, Jareth	3
A3	Definir objetivos del proyecto	08/04/26	08/04/26	1	$1,920	Capi, Mauricio, Jareth	3
B	**Investigación del usuario**	**06/04/26**	**17/04/26**	**10**	**$14,400**	-	-

ID	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración (Días)	Costo	Responsables	Cant. Trabajadores
B1	Investigar necesidades y comportamientos	06/04/26	10/04/26	5	$7,200	Jareth, Braulio, Mauricio	3
B2	Recopilar datos	13/04/26	17/04/26	5	$7,200	Jareth, Braulio, Mauricio	3
C	**Diseño de la interfaz**	**13/04/26**	**24/04/26**	**10**	**$16,000**	-	-
C1	Diseñar la interfaz gráfica	13/04/26	17/04/26	5	$8,000	Martín, Capi	2
C2	Diseñar flujos de la aplicación	20/04/26	24/04/26	5	$8,000	Mauricio, Braulio	2
D	**Prototipado**	**20/04/26**	**27/05/26**	**28**	**$84,000**	-	-
D1	Diseñar prototipos interactivos	20/04/26	15/05/26	20	$60,000	Capi, Mauricio, Jareth	3
D2	Probar prototipos	18/05/26	27/05/26	8	$24,000	Martín, Braulio, Karen	3
E	**Pruebas de usabilidad**	**04/05/26**	**07/08/26**	**70**	**$122,400**	-	-
E1	Planificar pruebas de usabilidad	04/05/26	08/05/26	5	$7,200	Braulio, Jareth	2
E2	Realizar pruebas con usuarios	11/05/26	19/06/26	30	$64,800	Martín, Jareth, Karen	3

ID	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración (Días)	Costo	Responsables	Cant. Trabajadores
E3	Recopilar datos de pruebas	22/06/26	03/07/26	10	$14,400	Braulio, Karen	2
E4	Evaluar resultados	06/07/26	10/07/26	5	$7,200	Braulio, Mauricio	2
E5	Realizar cambios en el diseño	13/07/26	07/08/26	20	$28,800	Martín, Capi	2
F	**Documentación**	**20/07/26**	**11/09/26**	**40**	**$12,800**	-	-
F1	Documentar el diseño de la interfaz	20/07/26	14/08/26	20	$6,400	Karen	1
F2	Crear documentos de referencia	17/08/26	11/09/26	20	$6,400	Karen	1
	TOTAL			**164**	**$261,120**		

Estructura de recursos:

Rol	Pago Diario	Pago Mensual
Analista de requisitos	$640	$18,000
Diseñador de producto	$800	$20,000
Especialista en Prototipado	$1,000	$25,000
Tester	$720	$18,000

Rol	Pago Diario	Pago Mensual
Investigador	$480	$12,000
Documentador	$320	$8,000
